




YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



2022



İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	2
2. GENEL DEĞERLENDİRME	3
2.1 Üniversite Misyonu	3
2.2 Üniversite Vizyonu	3
2.3 Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	3
Amaçlar:	3
Hedefler:	3
2.4 Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynağı	4
2.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi.....	6
2.6 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	7
2.7 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
3. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	8
3.1 Proje Bazlı Harcamalar.....	8
3.2 Tamamlanan Projeler	15
4. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER.....	16
4.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	16
4.2 Öneriler.....	16



1. GİRİŞ

Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet süreçlerine yansıtma üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır.

2015 yılında kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözetilen eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş iş birliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır.


Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmalarını da kendisine önemli bir misyon edinmiştir.

2022 yılında en önemli hedefimiz, Üniversitemizin en kısa sürede yapılandırılması ve bu sayede etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi olmuştur.

Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder konuma getirerek, teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla kısacası her türlü fiziki altyapılarıyla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak Üniversitemizin öncelikli hedeflerindedir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz.

Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

Üniversitemizin 2022 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci ve 60'ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.



2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Üniversite Misyonu





Evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin daha sonra bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektedir.

2.2 Üniversite Vizyonu







Bilgi, ürün ve hizmet üreterek turizm, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olmaktır.











2.3 Üniversitemizim Temel Amaç ve Hedefleri

Amaçlar:

-  Çağdaş ve kaliteli eğitim- öğretimle, eğitim ve öğretim niteliğini/başarısını arttırmak.
-  Üniversitenin bilimsel altyapısını ve akademik yapısını güçlendirmek.
-  Toplumsal, ekonomi, tarım, turizm, kalkınma ve girişimcilik alanlarında bölgede destek olmak.
-  Kurumsal kültürü ve kapasiteyi arttırmak.

Hedefler:

-  Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı deneyim kazanmasının sağlamak,
-  Üniversitenin başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak,
-  Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak,
-  Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek,
-  Üniversitemizin ulusal ve uluslararası prestijini arttırmak,
-  Çağdaş, donanımlı derslik laboratuvar, atölye, sağlık merkezleri, öğrenci yaşam merkezi Teknokent ve kültür merkezleri olanaklar sağlamak.

-  Bilimsel araştırma-geliştirme süreçlerinde fiziksel alt yapının güçlendirilmesi, etkin kullanımının sağlanması,
-  Bilimsel yayın sayısının her yıl %10 arttırılması (SCI, SCI-Exp, SSCI...),
-  Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen kongre, konferans ve sempozyumların arttırılması.
-  Bölge turizmine katkı sağlamak ve tarımsal verimi arttırmak,
-  Bölgesel ve ulusal düzeyde şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,
-  Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve bölgeye yönelik sektörel iş birliğini geliştirmek,
-  Sağlık alanında ürün ve hizmetlerin tanıtımını ve etkileşimini arttırmak.
-  Kurumsal kalite kültürünü üniversite geneline yaymak,
-  Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmek,
-  Mezunlarla iletişimi sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek.


2.4 Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynağı

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu sebeple Üniversitemiz hazineden gelen cari ve sermaye transferleri haricinde öz gelirlere de sahiptir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin 2022 yılı gelirleri Tablo1’de verilmiştir.


Tablo 1 Üniversitemizin 2022 Yılı Gelir Dağılımları

GELİRLER	TUTAR
Alınan Bağış ve Yardımlar	259.288.165,20
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımla	259.262.000,00
Cari	199.538.915,00
Sermaye	59.723.085,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	8.165,20
Proje Yardımları	18.000,00
Öz Gelirler	16.932.547,54
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.012.961,59
Diğer Gelirler	6.919.585,95
Toplam	276.220.712,74

Grafik 1 2022 Yılı Gelirlerin Dağılımı



Grafik 2 2021 ve 2022 Yılı Gelirlerin Karşılaştırılması

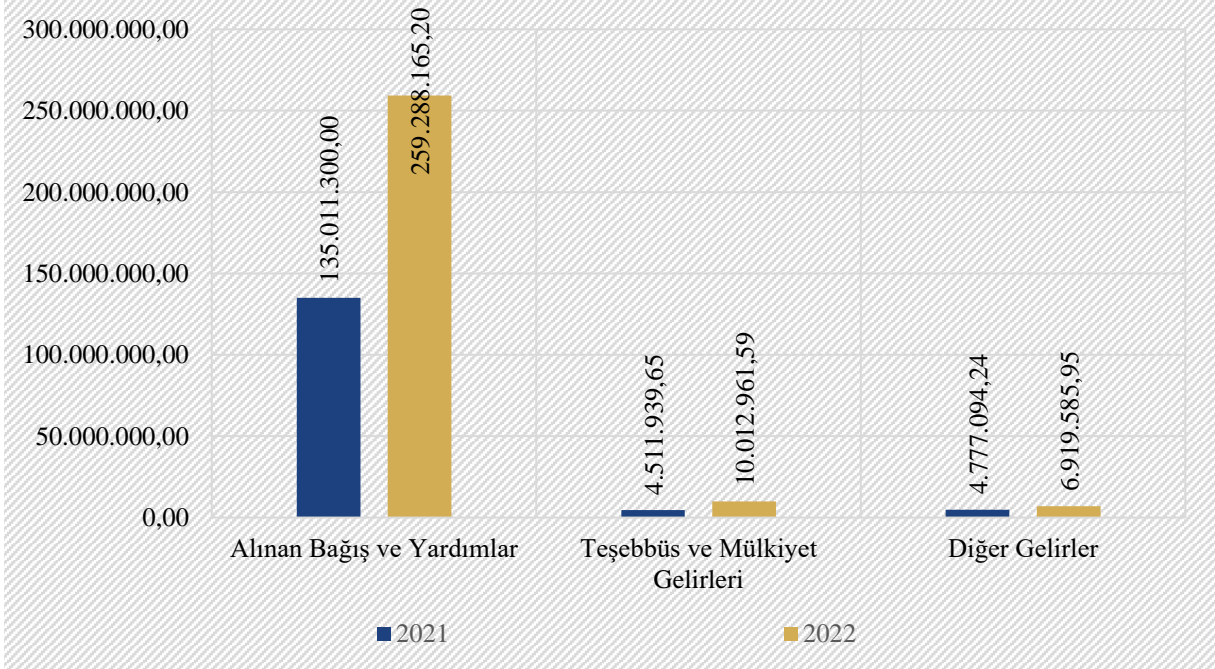

2.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi

Tablo 2 Yerleşke Alanlarının Hizmet Yerine Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanları (m ²)							Toplam
	Bina Adı	Eğitim	Sağlık	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer (İdari Depo, Tesis vb.)	
Kestel Yerleşkesi	Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi & Rektörlük	3.950	-	175	328		10.067	14.520
Kestel Yerleşkesi	ALTSO MYO & Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	1.830	-	35	-	-	2.957	4.822
Kestel Yerleşkesi	ALTSO Turizm MYO & Sağlık Hizmetleri MYO	1.686	-	216	-	-	3.770	5.672
Kestel Yerleşkesi	Kapalı Spor Salonu	-	-	-	-	1.050	-	1.050
Kestel Yerleşkesi	Tıp Fakültesi	1.084	-	77	77	-	743	1.981
Kestel Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi & Spor Bilimleri Fakültesi	130	-	322		-	1.611	2.063
Kestel Yerleşkesi	Eğitim Fakültesi	3.476	-	150	215	-	8.159	12.000
Kestel Yerleşkesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi & Turizm Fakültesi	1.746	10	216	110	-	4.190	6.272
Kestel Yerleşkesi	Öğrenci Yaşam Merkezi	-	140	5.940	-	920	-	7.000
Kestel Yerleşkesi	Çarşı yeri	-	-	-	-	-	1.700	1.700
Kestel Yerleşkesi	Anaokulu ve Teknoloji Transfer Ofisi	1.900	-	-	-	-	1.300	3.200
Kestel Yerleşkesi	İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Laboratuvarı	210	-	-	-	-	-	210
Konaklı Yerleşkesi	Diş Hekimliği Fakültesi	401	1.100	80	-	-	1.669	3.250
Konaklı Yerleşkesi	Konaklı Kongre Merkezi (Yabancı Diller Yüksekokulu)	12.000	-	-	-	-	-	12.000
Akseki Yerleşkesi	Akseki MYO	1.032	-	23	-	-	2.340	3.395
Gazipaşa Yerleşkesi	Gazipaşa MRB MYO & Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi	994	-	335	-	-	2.599	3.928
Toplam		30.439	1.250	7.569	730	1.970	41.105	83.063

Tablo 3 Mülkiyetine Göre Taşınmazlar

Yerleşke Adı	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	Toplam (m ²)
Diş Hekimliği Fakültesi-Konaklı	-	-	Belediye Tahsis 3.250	3.250
Konaklı Kongre Merkezi	-	Hazine Tahsis 8.147	-	8.147
Kestel Yerleşkesi	-	Hazine Tahsis 220.000	-	220.000
Cikcilli Yerleşkesi	-	Hazine-Orman Tahsisli 875.000	-	875.000
Gazipaşa Yerleşkesi	4.800	-	-	4.800
Akseki Yerleşkesi	3.700	-	-	3.700
Toplam	8.500	1.103.147	3.250	1.114.897

2.6 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz Kestel Yerleşkesinde yer alan Merkezi Derslik ve Ofis Binası İnşaatı 2022 yılı sonu itibariyle %75 bir gerçekleştirmeye sahip olup; 2023 yılının ilk altı ayında bitirilmesi planlanmaktadır. Kestel yerleşkesi giriş kapısı 2022 yılının ilk aylarında tamamlanmış ve hizmete açılmış; çevre düzenlemesi aynı dönemde bitirilmiştir. İhalesi 11.10.2021 tarihinde yapılan Cikcilli Yerleşkesi Saha Tazim İşleri 2022 yıl sonu itibariyle %100 gerçekleştirmeye ulaşılmış ve bitirilmiştir.

Tablo 4 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

Proje No	Proje Adı	Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Harcama Gerçekleşme Oranı %	Açıklama
2022H03-186268	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000,00	63.720,00	0,32%	AlkÜ enerji etüdü yapılmış ve proje tamamlanmıştır
2022H03-186500	Kampüs Altyapısı	6.000.000,00	5.811.461,40	0,97%	Cikcilli Yerleşkesi Saha Tazim İşlerinin Yapılması İşleri (%100 tamamlandı) 1600 kVA Trafo ve Yol aydınlatması Yapılması İşleri (%100 tamamlandı) Çevre Düzenlemesi Yapılması İşleri (%100 tamamlandı) ALKÜ Giriş Kapısı Yapılması İşleri (%100 tamamlandı)
2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	40.750.000,00	35.791.137,26	0,88%	Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası inşaatı yapımına devam edilmiştir.
2022H03-186263	Yayın Alımı	1.000.000,00	843.790,76	0,84%	Proje Tamamlandı
2022H03-186261	Muhtelif İşler	18.050.000,00	9.749.734,49	0,54%	Proje Tamamlandı
2022H05-186634	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250.000,00	0,00	0,00%	Proje Tamamlandı
2022I00-186242	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	3.500.000,00	3.296.882,96	0,94%	Proje Tamamlandı

2.7 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Tablo 5 2022 Yılı Yatırım Programı Proje Dağılımları

Proje No	Proje Adı	Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Harcama Gerçekleşme Oranı %
2022H03-186268	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000,00	63.720,00	0,32%
2022H03-186500	Kampüs Altyapısı	6.000.000,00	5.811.461,40	0,97%
2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	40.750.000,00	35.791.137,26	0,88%
2022H03-186263	Yayın Alımı	1.000.000,00	843.790,76	0,84%
2022H03-186261	Muhtelif İşler	18.050.000,00	9.749.734,49	0,54%
2022H05-186634	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250.000,00	0,00	0,00%
2022I00-186242	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	3.500.000,00	3.296.882,96	0,94%

3. 2022 Yılı Proje Uygulamaları


3.1 Proje Bazlı Harcamalar

3.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Tablo 6 Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje Harcamaları

İşin Adı	Harcama
Enerji Etütlerinin Yapılması ve Enerji Raporunun Yazılması İşİ	63.720,00

Grafik 3 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Ödenek Durumu

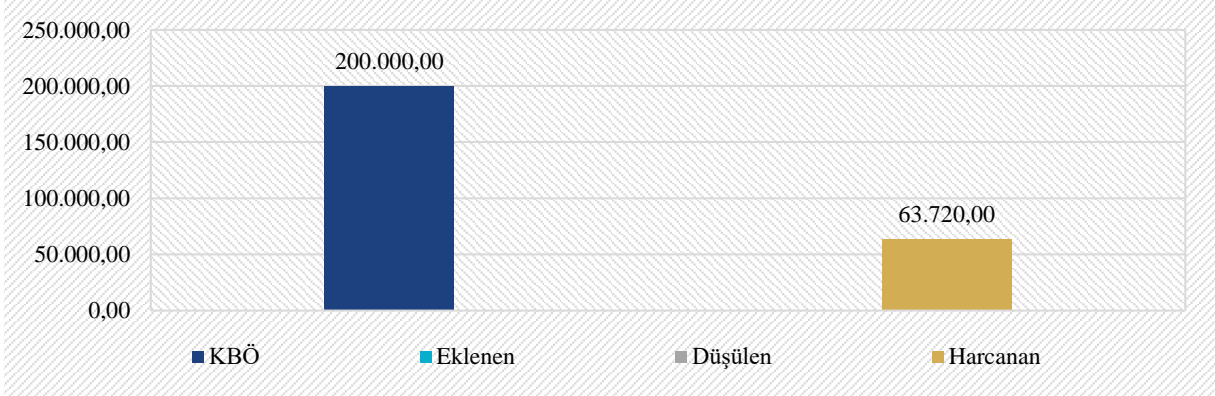


3.1.2 Kampüs Altyapı Projesi

Tablo 7 Kampüs Altyapı Proje Harcamaları

İşin Adı	Harcama
Kestel Yerleşkesi 1600 kVA Trafo ve Yol Aydınlatması Yapılması İşİ	3.735.161,69
Kestel Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapılması İşİ	1.585.454,51
Kestel Yerleşkesi ALKÜ Giriş Kapısı Yapım İşİ	48.104,20
Cikcilli Yerleşkesi Saha Tanzim İşlerinin Yapılması İşİ	442.741,00
Toplam	5.811.461,40

Grafik 4 Kampüs Altyapı Projesi Ödenek Durumu

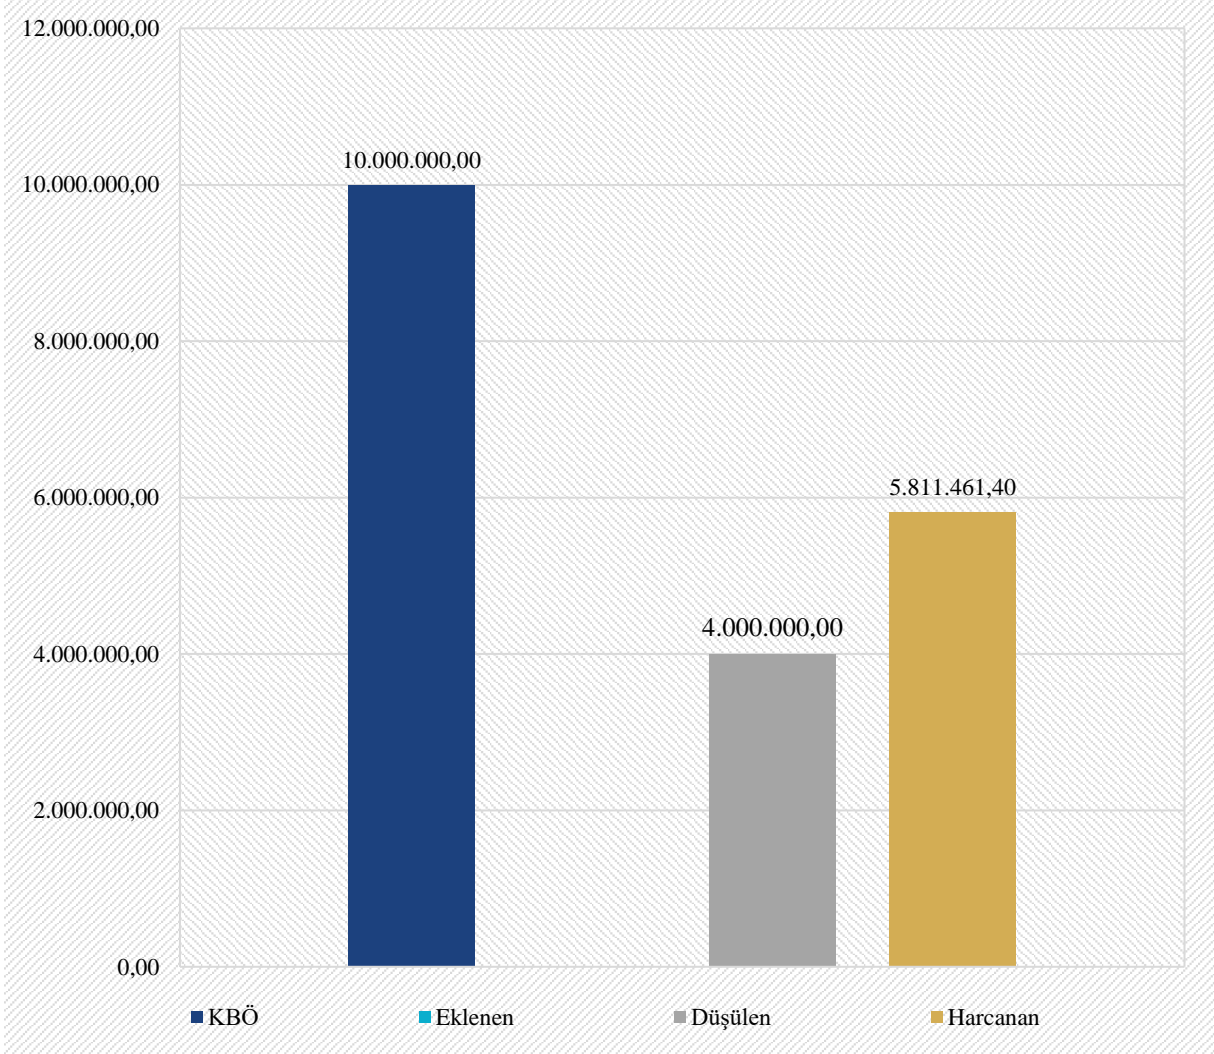


3.1.3 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Tablo 8 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları

İşin Adı	Harcama
Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı	35.791.137,26

Grafik 5 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Ödenek Durumu

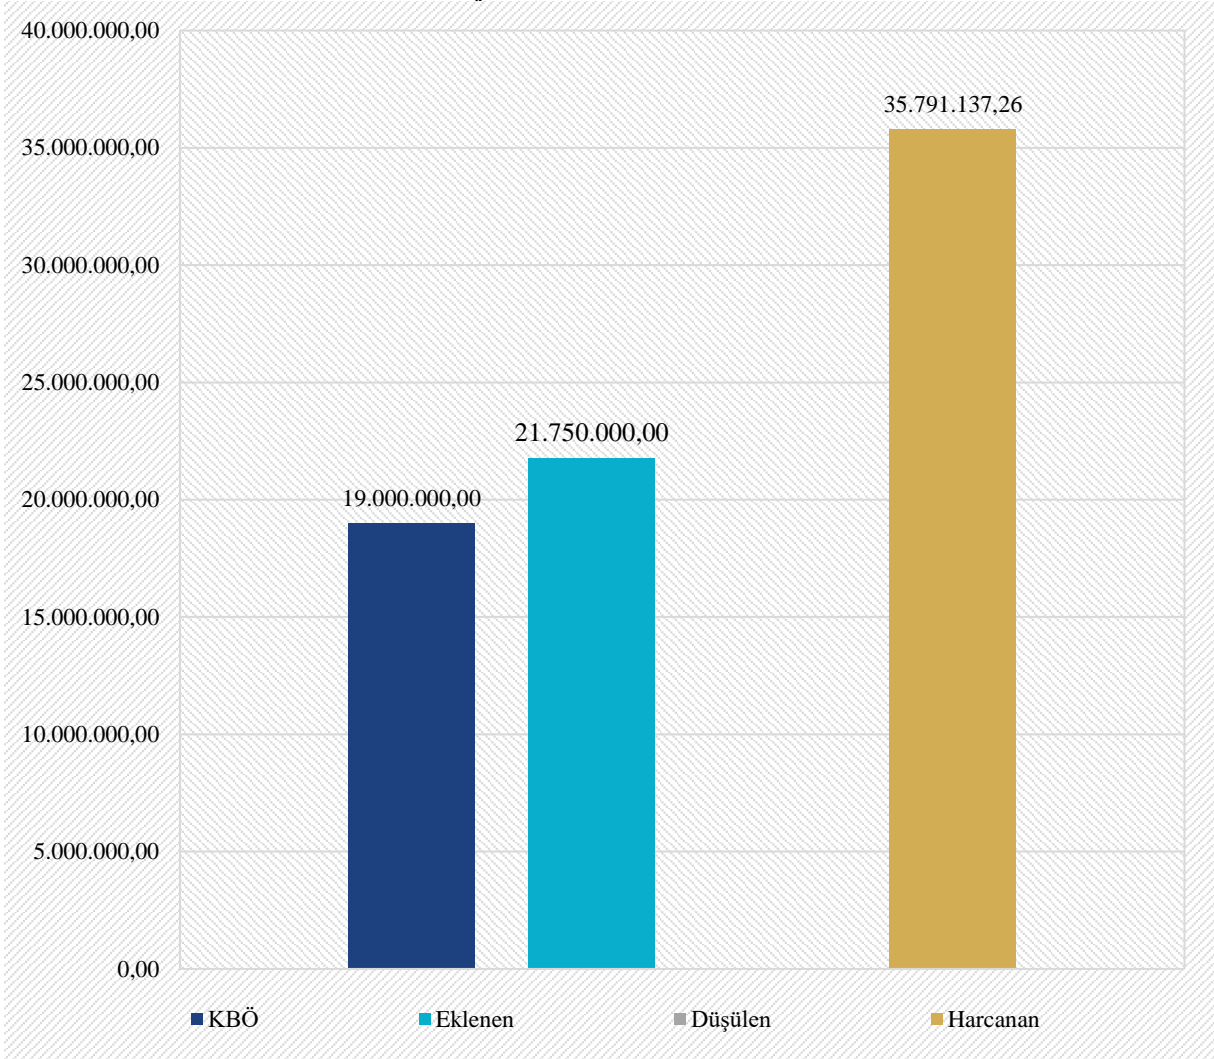


3.1.4 Yayın Alımı Projesi

Tablo 9 Yayın Alımı Projesi Harcamaları

İşin Adı	Harcama
UHF RFID Güvenlik Kapısı Alımı	120.360,00
Veri Tabanı Alımı	121.094,86
Teknik Destek ve Bakım Hizmeti Alımı	56.050,00
VETİS Programı Hizmeti Alımı	41.300,00
Kitap Alımı	70.960,77
Abonelik Ücret Ödemesi	434.025,13
Toplam	843.790,76

Grafik 5 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Ödenek Durumu

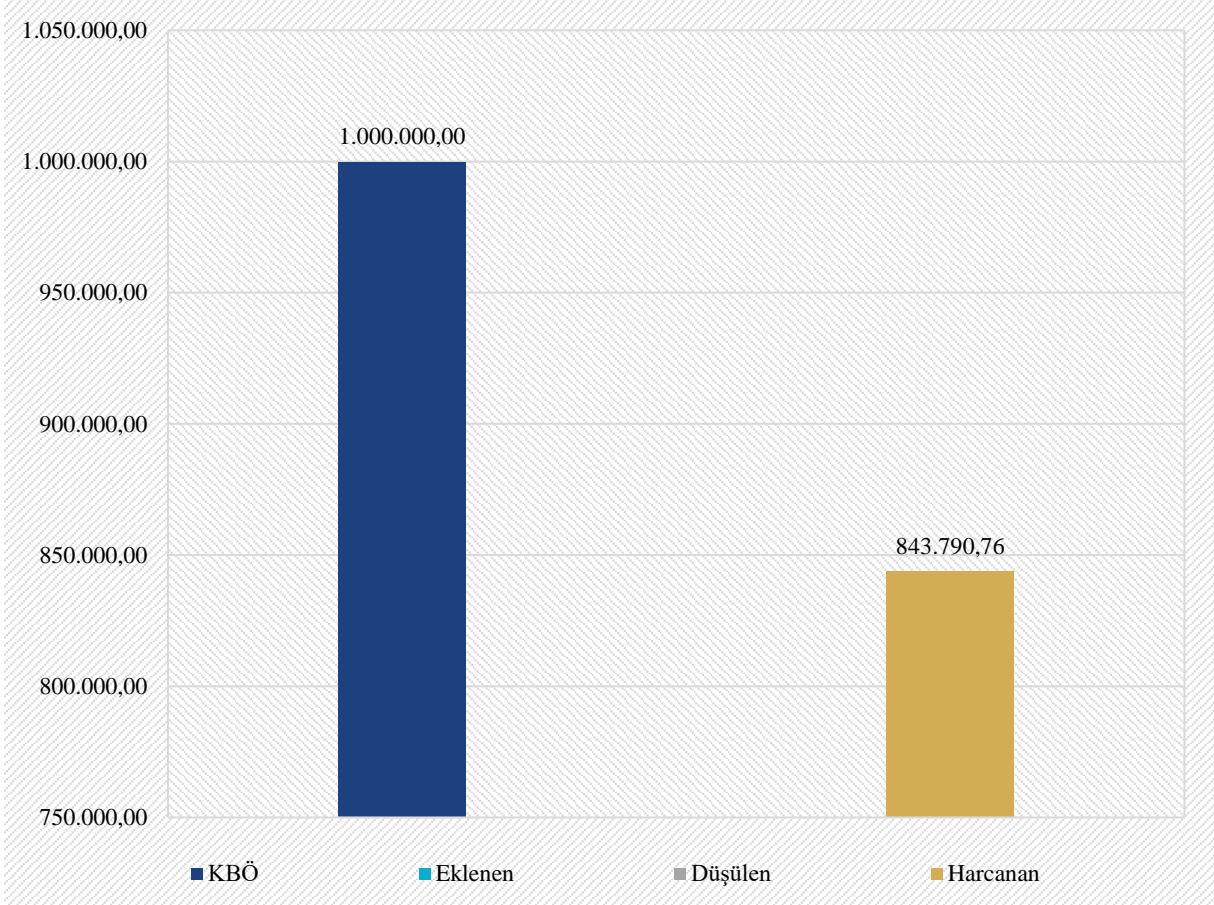


3.1.5 Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü)

Tablo 10 Muhtelif İşler Projesi Harcamaları

İşin Adı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Harcama	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Harcama	Genel Toplam
Büro Makineleri Alımı		793.961,94	43.779,16	837.741,10
Bilgisayar Alımları			1.943.678,54	1.943.678,54
İşyeri Makine Teçhizat Alımları		253.368,88	2.010.108,58	2.263.477,46
Diğer Makine Teçhizat Alımları		148.244,58	981.359,24	1.129.603,82
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları			471.249,81	471.249,81
Diğer Fikri Hak Alımları			322.829,04	322.829,04
Diğer Avadanlık Alımları			20.414,00	20.414,00
Büro Mefruşatı Alımları		1.144.572,20		1.144.572,20
Okul Mefruşatı Alımları		24.157,79		24.157,79
Diğer Mefruşat Alımları		34.020,00		34.020,00
Laboratuvar Cihazı Alımları		419.959,56		419.959,56
Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	1.138.031,17			1.138.031,17
Toplam	1.138.031,17	2.818.284,95	5.793.418,37	9.749.734,49


Grafik 6 Muhtelif İşler Projesi Ödenek Durumu

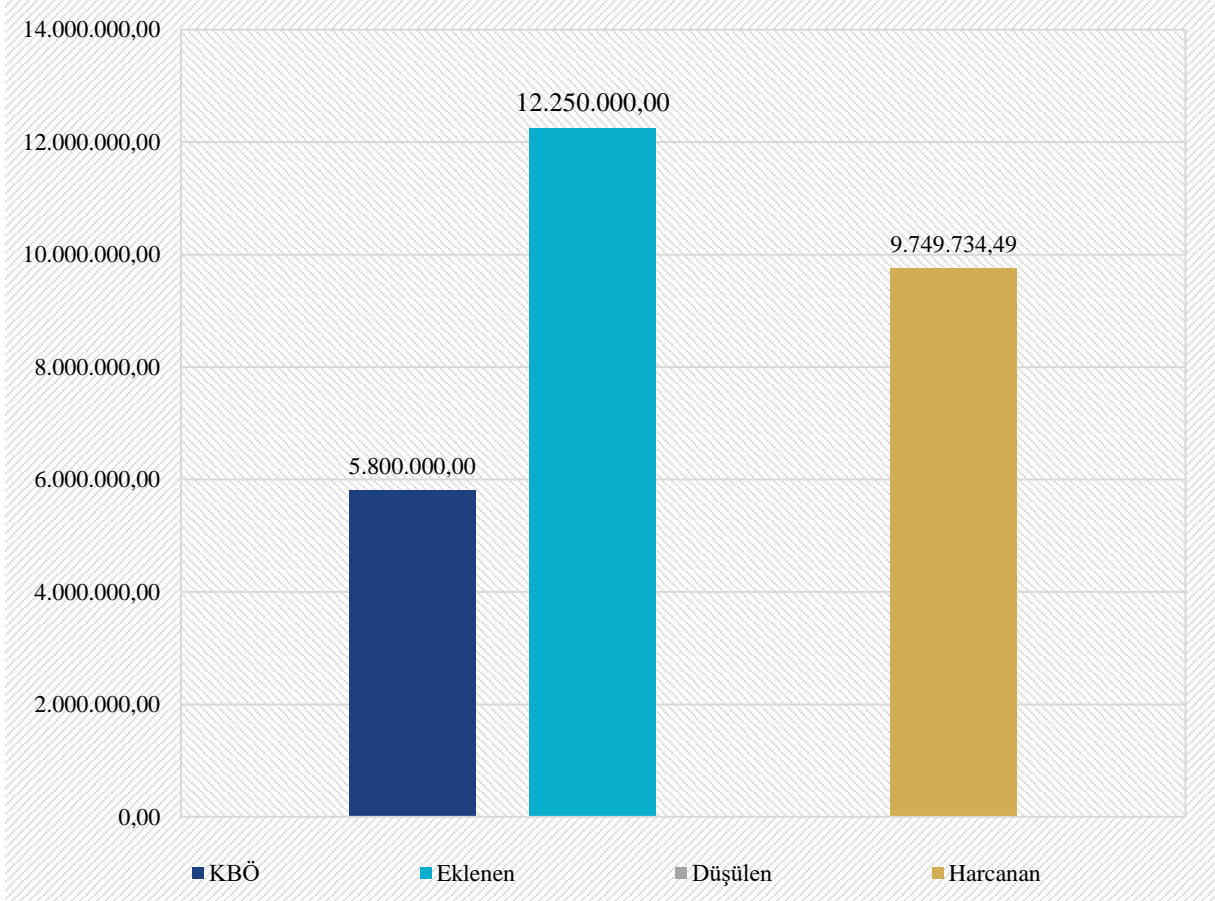

3.1.6 Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesinde 2022 yılı içerisinde mevcut spor tesisleriyle ilgili bakım onarım çalışması yapılmamış ve bu projenin ödeneği 2023 yılına devretmiştir.

Grafik 7 Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi Ödenek Durumu

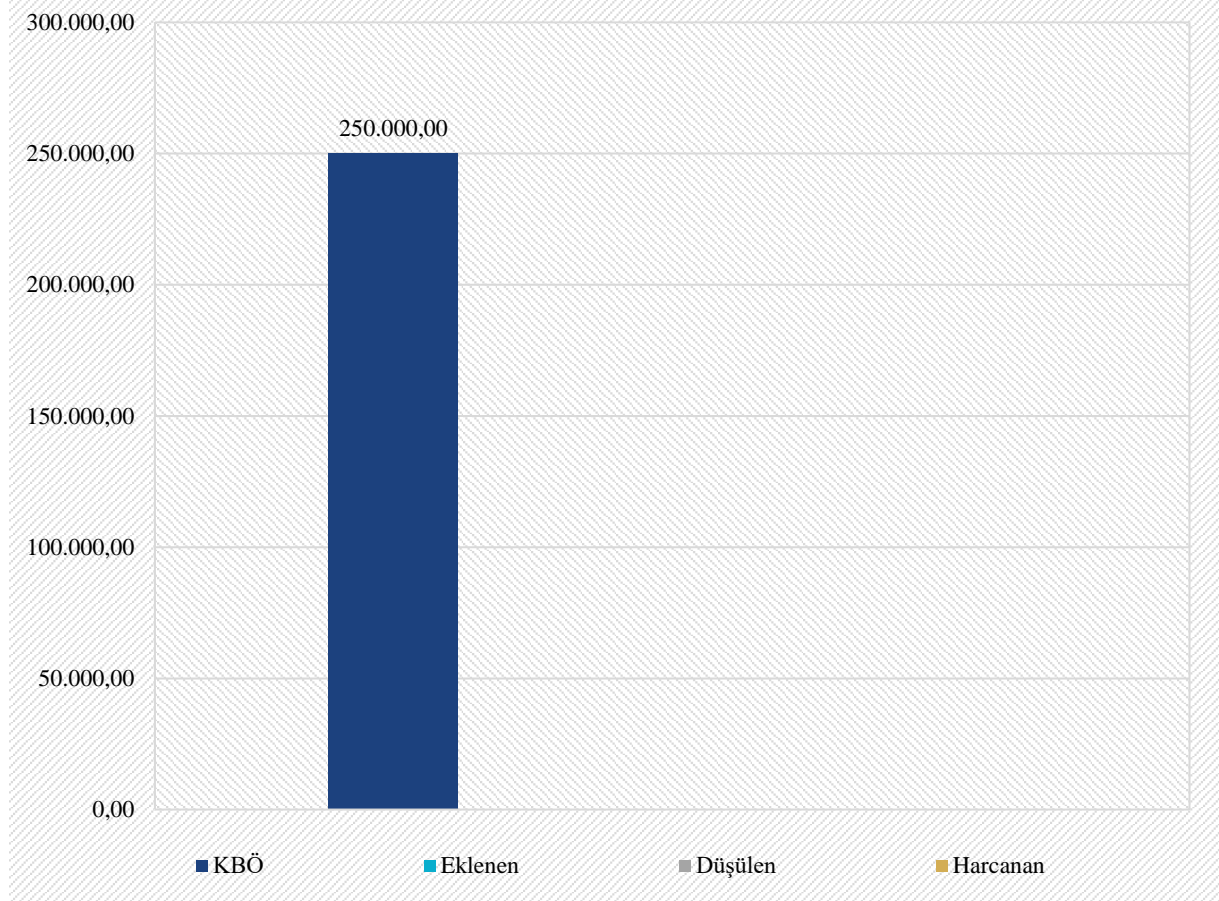


3.1.7 Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)

Tablo 11 Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü) Projesi Harcamaları

İşin Adı	Harcama
Büro Mefruşatı Alımları	55.140,70
Bilgisayar Alımları	239.394,15
Tıbbi Cihaz Alımları	2.873.115,76
Laboratuvar Cihazı Alımları	51.840,00
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	77.392,35
Toplam	3.296.882,96

Grafik 8 Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü) Projesi Ödenek Durumu

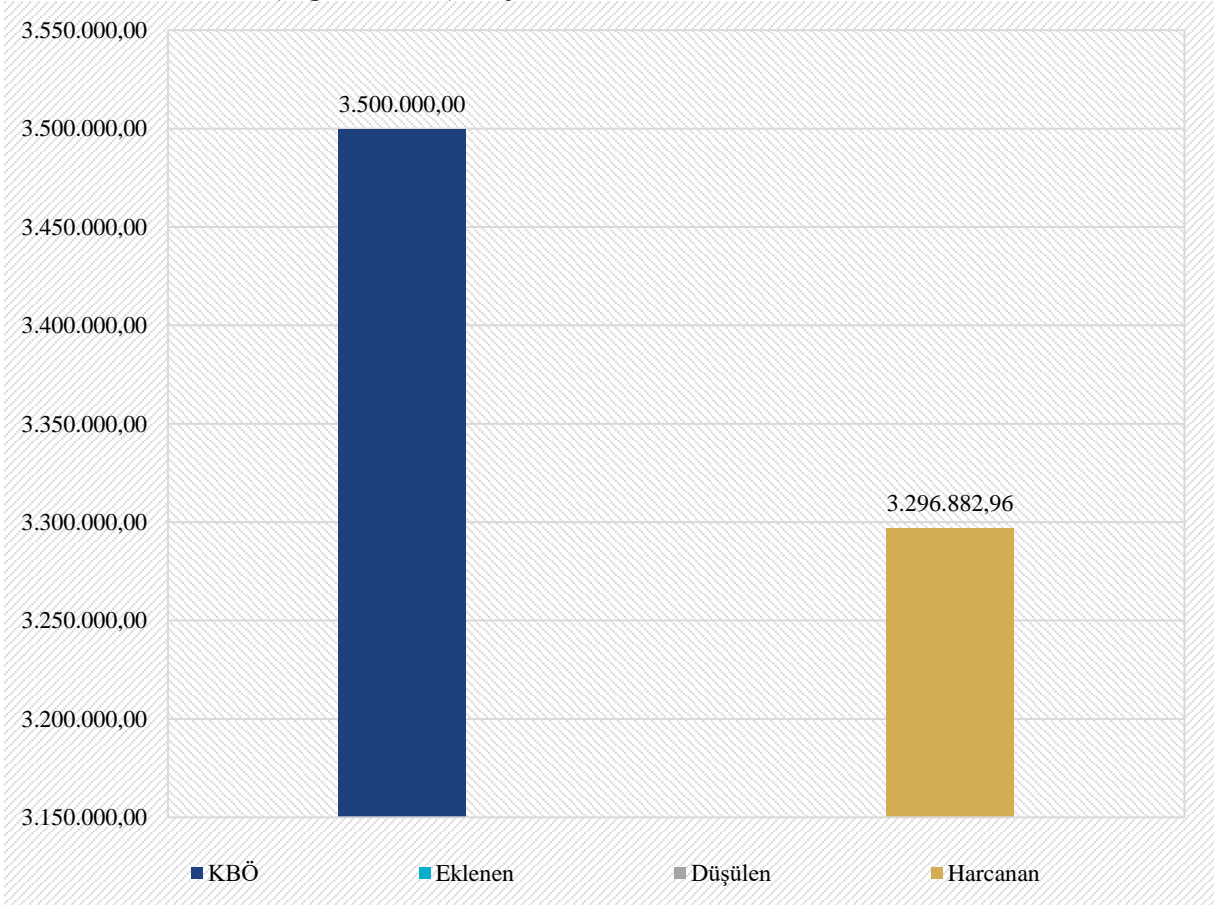

3.2 Tamamlanan Projeler






Tablo 12 2022 Yılında Tamamlanan Projeler

Proje No	Proje Adı	Bütçesi
2022H03-186268	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe
2022H03-186500	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe
2022H03-186263	Yayın Alımı	Özel Bütçe
2022H03-186261	Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü)	Özel Bütçe
2022H05-186634	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe
2022I00-186242	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	Özel Bütçe









4. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

4.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

-  Döviz kurundaki dalgalanmalar, fiyat istikrarının tam olarak sağlanamaması, ihale süreçlerinin uzun sürmesi... gibi nedenler maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesi güçleştirmektedir. Bu da isteklilerin risk almaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte istekli ihaleyi almış olsa bile, projenin uygulanması aşamasında, sürekli artan fiyatlar yüklenicilerin zor durumda kalmasına sebep olmaktadır.
-  Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının da etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmesine neden olmaktadır.
-  Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi neticesinde ihtiyaçlar oranında bir fiziki kapasite artışı sağlanamamaktadır.
-  Yatırım ödenekleri, yılı yapım işlerinin başlangıç dönemleri dikkate alınmadan, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Ayrıntılı Finansman Programına son şekli verilmektedir.
-  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması sonucu ihalelerin geç sonuçlanması ve yapım ve alım işlerinin zamanında tamamlanamamasına neden olmaktadır.

4.2 Öneriler

-  Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından verilen ödeneklerin belirli oranda değil de kurumların öğrenci sayıları, fiziki koşulları vs. gözetilerek ödenek dağılımının yapılması,
-  Yeni kurulan üniversitelerin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer üniversitelere nazaran daha fazla yatırım ödeneklerinin verilmesi,
-  İldeki diğer yatırımcı kuruluşların araç-gereç ve diğer imkânlarının kullanılmasına yönelik düzenleme ve mekanizmaların oluşturulması,
-  Üniversite ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli personel için kadro tahsisi yapılması,
-  Yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalarda doğrudan temin miktar ve oranının daha yüksek tutulması,
-  Konut fiyatlarının yüksek olduğu Antalya bölgesinde görev yapan akademik ve idari personelimiz için lojman yapılması, önerilmektedir.



2022 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Tabloları

Kuruluş Adı : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Sektör adı : Eğitim

2022 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi (Bin TL)

Tablo 13 2022 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Tablosu (Eğitim Sektörü)

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	Ödenek Ekleme +/- (12)	Aktarma Mik. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2022H03-186268	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2022	Alanya	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	64
2022H03-186500	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2022	Alanya	0	30.000	0	0	0	10.000	-4.000	0	0	0	5.811
2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2024	Alanya	0	132.000	60.788	0	0	19.000	+21.750	0	0	0	35.791
2022H03-186263	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2022	Alanya	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	844
2022H03-186261	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2022	Alanya	0	5.798	0	0	0	5.798	+12.250	0	0	0	9.750
2022H05-186634	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2022	Alanya	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
2021H05-185644	Spor Kompleksi	Şartlı Bağış ve Yardım	2023	Alanya	0	7.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	176.398	60.788	0	0	36.248	30.000	0	0	0	52.260

Kuruluş Adı : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Sektör adı : Sağlık

2022 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi (Bin TL)

Tablo 14 2022 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Tablosu (Sağlık Sektörü)

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	Ödenek Ekleme +/- (12)	Aktarma Mik. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2022I00-186242	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2022	Alanya	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.297
					0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.297

2021 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Kurum Adı: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Bütçe Türü: Özel Bütçe

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Tablo 15 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Yılı Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 yılı İtibariyle Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	169.248	169.248		15.000	15.000		36.248	36.248					52.260	52.260
Sağlık	1	3.500	3.500					3.500	3.500					3.297	3.297
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	7	172.748	172.748		15.000	15.000		39.748	39.748					55.557	55.557
